
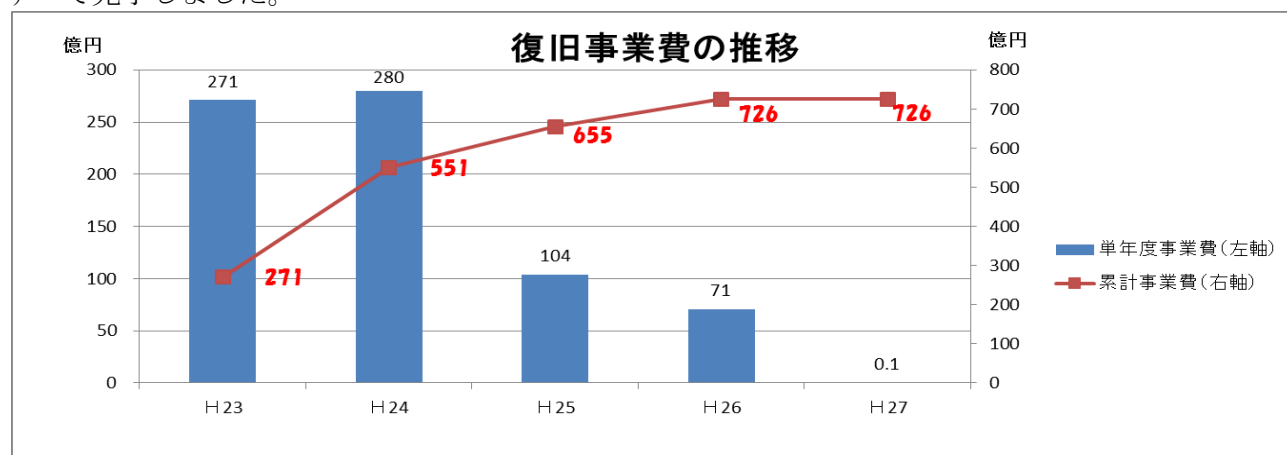


1 復旧計画について

復興に向けた基本方針等を示した「復興ビジョン」(H23. 9 月策定)に基づき、被災した公共施設や社会基盤等の復旧に係る工程表を平成 23 年 10 月に策定したものであり、この工程表により、震災からの早期復旧を図るとともに、市民の皆さまの安全・安心を最大限に確保しながら、復旧に向けた事業を推進してきました。

- 計画期間：平成 23～25 年度（3 年間）
- 全体事業費：725 億 6,400 万円（契約額ベース）
- 施設等区分：124 区分（すべて完了）

復旧事業の総事業費については、当初計画では約 614 億円と見込んでいましたが、その後の市民の皆さまのニーズを踏まえた復旧手法の変更や、資材・労務単価の上昇などの変動要因により、約 726 億円（約 112 億円増）となり、事業が一部遅延しましたが、平成 27 年度に 124 区分すべて完了しました。

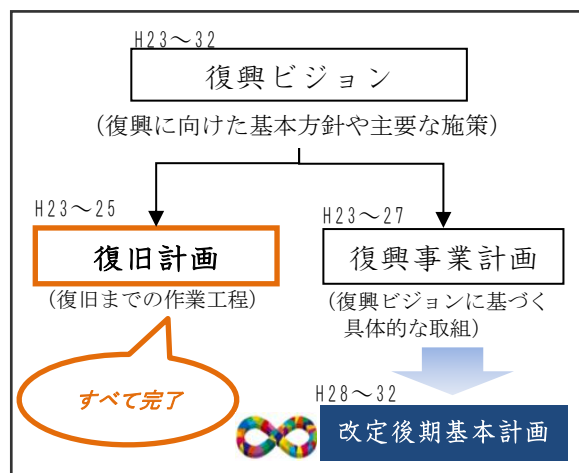

2 主な取組内容

(1) 生活・環境

(11 区分/事業費 484 億円)

①ごみ処理施設（約 3 億円）

H23 年度：北部、南部清掃センター、山田粗大ごみ処理施設を復旧
H24 年度：リサイクルプラザクリンピーの家を復旧



②がれき処理（約 439 億円）

H23 年度：10.3 万 t H24 年度：31.0 万 t H25 年度：28.2 万 t
H26 年度：24.1 万 t（合計）93.6 万 t を処理
※仮置場については、19 か所全てにおいて集積した廃棄物の処理を完了し、整地等現状復旧した。

(2) 土木

(8 区分/事業費 59 億円)

①道路（約 29 億円）

H24 年度までに：2, 239 か所復旧
H25 年度：50 か所復旧（忠多 9 号線《常磐》外 4 路線等）
H26 年度：2 か所復旧（根小屋 1 号線《勿来》等）
全 2, 291 か所を復旧



②河川（約 9 億円）

H23 年度：31 か所復旧（浦沢川《平》、赤沼川《平》等）
H24 年度：9 か所復旧（原高野川《平》、横手川《小名浜》等）
H25 年度：10 か所復旧（藤間川《平》等）
H26 年度：1 か所復旧（大平川《小名浜》）
H27 年度：2 か所復旧（御堂川《勿来》、横内川《久之浜》）
全 53 か所を復旧

(3) 教育

(16 区分/事業費 44 億円)

①小学校校舎・校庭（約 7 億円）

H23 年度：66 か所復旧（平一小、中央台北小、小名浜一小等）
H24 年度：桶売小復旧
H25 年度：植田小復旧
H26 年度：永崎小復旧 全 69 か所を復旧

②中学校校舎・校庭（約 3 億円）

H23 年度：35 か所復旧（平一中、江名中、勿来一中等）
H24 年度：5 か所復旧（小名浜一中、植田中、永井中等）
全 40 か所を復旧
※ 豊間中、田人中は「学校のあり方」に関する基本方針に基づき対応。

③学校給食共同調理場（約 16 億円）

H23 年度：5 か所復旧（平南部、小名浜、常磐等）
H24 年度：2 か所復旧（平北部、四倉）
全 7 か所を復旧（※田人は H27 年度をもって廃止。勿来は復興事業計画に基づき移転改築を行い、H28 年度から供用開始）



(4) 農林・水産

(15 区分/事業費 10 億円)

①農業基盤施設等（約 5 億円）

H24 年度までに：【農道】65 か所復旧
H25 年度までに：【ため池】32 か所復旧、
【農業用取水堰】7 か所復旧、
【橋梁】1 か所復旧、【水路】171 か所復旧、
H27 年度：【排水機場】4 か所復旧

②市場（約 3 億円）

H24 年度：小名浜魚市場西棟解体工事完了
中央卸売市場は敷地内の法面崩落等を復旧



(5) 商工・観光

(20 区分/事業費 6 億円)

①観光施設（約 2,300 万円）

H23 年度：石炭・化石館ほるる、さはこの湯、海竜の里センター、勿来関文学館歴史館を復旧
H24 年度：二ツ箭山、背戸峨廊、波立薬師弁天橋の詳細な現地調査（二ツ箭山は安全性の確認がとれ入山可能）
H25 年度：背戸峨廊の散策路復旧（トッカケの滝まで）



②産業関連施設（約 5 億円）

H23 年度：労働福祉会館、勿来勤労青少年ホームを復旧、久之浜地区仮設店舗・事務所（浜風商店街）オープン
H24 年度：四倉中核工業団地内仮設施設の工事等完了、小名浜臨海工場団地緑地、産業創造館企画展示ホールの復旧
H25 年度：共同職業訓練センターが好間地区へ移転し供用開始

(6) その他

(54 区分/事業費 123 億円)

①応急修理制度（約 83 億円）

全壊、大規模半壊又は半壊した住宅を応急修理（上限 52 万円）
実績：全壊 1,175 世帯 大規模半壊 3,167 世帯 半壊 12,731 世帯
合計 17,073 世帯

②下水道管渠等（約 22 億円）

H24 年度：中部、東部浄化センターに流入する 2 処理区を復旧
H25 年度：北部、南部浄化センターに流入する 2 処理区を復旧

