

**いわき市復旧計画
(平成 23 年 10 月策定)
の進捗状況について**

平成 28 年 3 月 31 日現在

【目次】

I 進捗状況の概要

いわき市復旧計画の進捗状況の概要について（平成28年3月31日現在）・・・01

II 小区分(施設)別の復旧状況

1	行政経営部	03
○	防災施設	03
2	総務部	04
○	市役所本庁舎	04
○	東分庁舎	05
○	支所	05
○	市民サービスセンター	06
○	イントラネット	07
3	市民協働部	08
○	市民会館	08
○	市立集会所	09
○	地域集会所	10
○	小規模給水施設等	10
○	消費生活センター	11
○	アリオス	12
4	生活環境部	13
○	下水道処理施設	13
○	下水道ポンプ場施設	13
○	下水道管渠等	14
○	ごみ処理施設	15
○	衛生センター	16
○	公衆便所	17
○	がれき処理	17
5	保健福祉部	19
○	保育所	19
○	児童クラブ	20
○	児童館	20
○	老人福祉施設	20
○	その他の福祉施設	21
6	農林水産部	22
○	宿泊施設	22
○	農業基盤施設等	22

○ 林業基盤施設等	24
○ 市場	24
7 商工観光部	26
○ 宿泊施設	26
○ 観光施設	27
○ 産業関連施設	28
○ 公衆便所	28
○ 公営競技施設	29
8 土木部	30
○ 道路	30
○ 橋梁	32
○ 河川	33
○ 都市排水施設	34
○ がけ崩れ	35
○ 住宅団地被災	35
○ 市営住宅	35
○ 道の駅よつくら港(情報館)	36
9 都市建設部	37
○ 駅前広場	37
○ 応急修理制度	38
○ 公園	38
10 教育委員会	39
○ 小学校校舎(校庭)	39
○ 小学校体育館	40
○ 小学校プール	41
○ 中学校校舎(校庭)	41
○ 中学校体育館	42
○ 中学校プール	42
○ 幼稚園	44
○ 公民館	44
○ 図書館等	45
○ 体育施設	46
○ 学校給食共同調理場	48
11 消防本部	49
○ 消防施設等	49
12 水道局	50
○ 水道施設等	50
13 総合磐城共立病院	52
○ 総合磐城共立病院等	52

I 進捗状況の概要

いわき市復旧計画の進捗状況の概要について(平成 28 年3月 31 日現在)

○ポイント

平成 23 年度からの 5 年間で総事業費が約 726 億円の事業に取り組んできたところであり、すべての復旧事業が完了している。

1 計画の概要

(1) 趣旨

社会基盤等の復旧は、復興の礎となるものであることから、平成25年度までの概ね3年間で完了させ、本市の復興につながるよう、被災した社会基盤等の復旧に係る工程等を示したもの。

(2) 策定時期

平成23年10月

2 進捗状況

(1) 小区分別（施設等）の進捗状況

復旧計画に基づく小区分ごとの全124区分すべてにおいて復旧が「完了」している。

(2) 契約事業費ベースの進捗状況

契約事業費ベースでの進捗状況は、平成 27 年度末現在で 100%となっており、すべての工事の契約が完了している。

(単位：百万円)

区 分		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	合計	
計 画	事業費	単年度	38,099	12,550	10,734	28	0	61,411
		累計	38,099	50,649	61,383	61,411	61,411	61,411
	進捗率	単年度	62.04%	20.44%	17.48%	0.05%	0.00%	100%
		累計	62.04%	82.48%	99.95%	100.00%	100.00%	100%
実 績	事業費	単年度	27,092	27,988	10,397	7,074	13	72,564
		累計	27,092	55,080	65,477	72,551	72,564	72,564
	進捗率	単年度	37.34%	38.57%	14.33%	9.75%	0.02%	100%
		累計	37.34%	75.91%	90.23%	99.98%	100.00%	100%

(3) まとめ

復旧事業の総事業費については、当初計画では約614億円と見込んでいたが、その後の市民ニーズを踏まえた復旧手法の変更や、資材・労務単価の上昇などの変動要因により、約112億円増額となり、平成27年度末現在で約726億円となった。

これまで、当初計画と比較して遅れが生じた事業が一部あったものの、平成27年度末における進捗状況については、小区別（施設等）ごとの全124区分すべてにおいて復旧が完了した。

○平成27年度末実績（竣工）ベースでの進捗率

（単位：千円）

部等名	計画額		契約額		未契約額 (E)=(B)-(C)	進捗率 (F)=(C)/(B)	※参考 竣工分進捗率 (D)/(B)
	当初ベース (A)	現行ベース (B)	(C)	うち竣工分 (D)			
行政経営部	293,860	266,595	266,595	266,595	0	100.0%	100.0%
総務部	346,962	489,999	489,999	489,999	0	100.0%	100.0%
市民協働部	1,067,205	437,399	437,399	437,399	0	100.0%	100.0%
生活環境部	38,246,413	48,432,870	48,432,870	48,432,870	0	100.0%	100.0%
保健福祉部	509,861	176,504	176,504	176,504	0	100.0%	100.0%
農林水産部	1,244,733	962,029	962,029	962,029	0	100.0%	100.0%
商工観光部	442,193	615,569	615,569	615,569	0	100.0%	100.0%
土木部	8,794,135	5,923,707	5,923,707	5,923,707	0	100.0%	100.0%
都市建設部	3,460,280	8,600,610	8,600,610	8,600,610	0	100.0%	100.0%
教育委員会	4,068,301	4,423,910	4,423,910	4,423,910	0	100.0%	100.0%
消防本部	191,295	195,896	195,896	195,896	0	100.0%	100.0%
水道局	1,777,864	1,590,488	1,590,488	1,590,488	0	100.0%	100.0%
共立病院	967,856	448,292	448,292	448,292	0	100.0%	100.0%
合計	61,410,958	72,563,868	72,563,868	72,563,868	0	100.0%	100.0%

※各欄の金額は、平成23～27年度の合計額。

※平成27年度末時点の組織名称（こどもみらい部担当の保育所、放課後児童クラブは保健福祉部に、幼稚園は教育委員会に、それぞれ復旧完了時点の組織に含んでいる）。

上記のとおり、平成27年度末時点で、すべての復旧事業について契約・事業が完了している。

（各欄の説明）

※計画額(当初ベース)：復旧計画策定時（平成23年10月）の事業費

※計画額(現行ベース)：契約や設計などの変更要因を反映した事業費（契約済の場合は契約額、契約未済の場合は予算措置額、予算措置未済の場合は計画策定時の事業費）

※契約額：年度末における契約額

※うち竣工分：年度末において工事等が竣工した事業の契約額

※未契約額：年度末時点で契約に至らない事業の現行の計画額

※進捗率：契約額を現行の計画額で除した割合

Ⅱ 小区分（施設）別の復旧状況

1 行政経営部（完了1件／一部遅延0件：契約事業費ベースの進捗率 100%）

○ 防災施設（防災行政無線）

[総額 267 百万円（うち平成 27 年度までの契約済額 267 百万円）]

【完了】

被害のあった防災行政無線全 26 局を、平成 23 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
防災行政無線 (久之浜末続)		
防災行政無線 (平薄磯)		

2 総務部 (完了 15 件 / 一部遅延 0 件 : 契約事業費ベースの進捗率 100%)

○ 市役所本庁舎

[総額 173 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 173 百万円)]

【完了】

本庁舎 1 階市民棟は、平成 23 年度に復旧済。

議会棟と議会棟エレベーターホールを連結するエキスパンションジョイント、議会棟前階段等は、平成 24 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
本庁舎 (市民棟)		
本庁舎 (市民棟)		
本庁舎 (議会棟 エキスパンション ジョイント)		
本庁舎 (議会棟前 階段)		

○ 東分庁舎

[総額 15 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 15 百万円)]

【完了】

スロープ等は、平成 23 年度に復旧済。

地盤沈下による段差解消の工事は、平成 25 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
東分庁舎 (駐車場)		

○ 支所

[総額 182 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 182 百万円)]

【完了】

四倉、小川、三和、田人、川前、久之浜・大久の各支所は、平成 23 年度に復旧済。

小名浜、勿来、常磐、内郷、遠野の各支所は、平成 24 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
川前支所 (法面)		
小川支所 (文書保管庫)		

施設等名	復旧前	復旧後
四倉支所 (駐車場)		
内郷支所 (犬走り)		
勿来支所 (駐車場)		

○ 市民サービスセンター

[総額4百万円 (うち平成27年度までの契約済額4百万円)]

【完了】

江名市民サービスセンターは、平成24年1月に仮設公民館・市民サービスセンターの供用開始。

※被災した江名公民館と機能を集約し、移転改築のうえ、平成27年4月から業務開始。

○ イントラネット

[総額 116 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 116 百万円)]

【完了】

川前地区のケーブルは、平成 23 年度に復旧済。

本庁舎内、豊間地区・田人地区のケーブルは、平成 24 年度に復旧済。

渡辺地区のケーブルは、平成 25 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
渡辺地区 ケーブル	 A photograph showing a utility pole on a hillside. The area is overgrown with tall grass and brush, and the pole appears to be in a state of disrepair or abandonment.	 A photograph showing a utility pole on a hillside after restoration. The area is now clear of brush, and the pole is in good condition. The sky is blue with some clouds.
庁舎内の ケーブル	 A photograph showing the interior of a red metal cabinet. Several black and green cables are haphazardly bundled together and plugged into ports on a metal panel. The floor is covered with debris and a blue tarp.	 A photograph showing the interior of a red metal cabinet after restoration. The cables are now neatly organized and secured with ties. The floor is clean and covered with a blue tarp.

3 市民協働部（完了7件／一部遅延0件：契約事業費ベースの進捗率 100%）

○ 市民会館（勿来市民会館、常磐市民会館）

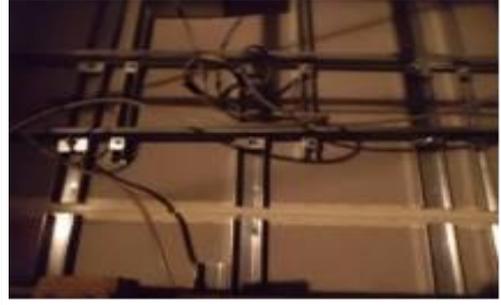
[総額 153 百万円（うち平成 27 年度までの契約済額 153 百万円）]

【完了】

勿来・常磐市民会館のホール等は、平成 24 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

【勿来市民会館】

施設等名	復旧前	復旧後
風除室 （取合い部 損傷）		
ホール客席 天井 （破損）		
ホール客席 （亀裂）		

【常磐市民会館】

施設等名	復旧前	復旧後
正面玄関 (ガラス 破損)		
ホール客席 天井 (反射板の ずれ)		
ホール客席 (亀裂)		

○ 市立集会所

[総額 17 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 17 百万円)]

【完了】

被害があった 16 箇所のうち 15 箇所は、平成 23 年度に復旧済。
津波被災地区にある田之網集会所は、平成 24 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
田之網 集会所 (外装)		

施設等名	復旧前	復旧後
下滝集会所 (浄化槽)		

○ 地域集会所

[総額 31 百万円 (うち平成 27 年度までの補助額 31 百万円)]

【完了】

地域集会所の修繕等に対する既存の補助制度に基づき、平成 23 年度に 54 施設、平成 24 年度に 10 施設の修繕を支援。

また、被害が軽微だったため、修繕補助を利用せずに復旧した施設は 37 施設。

※後田公民館、関田公民館など 14 施設は、復興交付金等により整備することとしており、復興事業計画で進捗管理を行っている。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
関田須賀 集会所 (外装)		

○ 小規模給水施設等

[総額 55 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 55 百万円)]

【完了】

公営水道の給水区域外にある地域が運営する小規模給水施設で、被害のあった 5 施設のうち、南大平(田人)、矢本(遠野)、野々志道(小川)の 3 施設は補助制度を活用し、平成 24 年度に復旧済。残る 2 施設のうち、高松(田人)は地区で平成 23 年度に復旧を行ったほか、浮矢(三和)は枯渇していた水源が自然復旧済。

また、飲用井戸等の再建等に対する補助制度を平成 23 年度に創設し、平成 24 年度までに延べ 202 件 (H23 : 120 件、H24 : 82 件) を支援。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
小規模 給水施設 (田人地区 南大平)		
飲用井戸等 (取水源の 変更)		

○ 消費生活センター

[総額1百万円 (うち平成27年度までの契約済額1百万円)]

【完了】

専有部分は、平成23年度に復旧済。

生涯学習プラザとの共有部分(廊下等)は、平成24年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
専有部分 (相談室)		
共有部分 (廊下壁)		

○ アリオス

[総額 180 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 180 百万円)]

【完了】

館内の全施設について平成 23 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
大ホール (天井剥離)		
大ホール (間仕切り壁 損傷)		
外構 (舗装陥没)		

4 生活環境部（完了 11 件／一部遅延 0 件：契約事業費ベースの進捗率 100%）

○ 下水道処理施設

[総額 460 百万円（うち平成 27 年度までの契約済額 460 百万円）]

【完了】

北部、東部、中部、南部浄化センターの全てが、平成 24 年度に復旧済。

地域汚水処理施設（勿来白米・南台）は、平成 23 年度に復旧済。

農業集落排水施設、（下小川、渡辺地区）は、平成 24 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
中部浄化センター （舗装）		
東部浄化センター （通路沈下）		

○ 下水道ポンプ場施設

[総額 1,124 百万円（うち平成 27 年度までの契約済額 1,124 百万円）]

【完了】

都市下水路・雨水排除ポンプ場は、平成 23 年度に浜川ポンプ場が、平成 24 年度に蜷川第一、蜷川第二、南富岡、御代、佐糠、大倉、関田、島ポンプ場が、平成 25 年度に江栗、植田第一、植田第二、大原、林城ポンプ場が復旧したことにより、被災した 14 施設が全て復旧済。

公共下水道ポンプ場は、平成 23 年度に平蔵塚、北白土第一、北白土第二、御厩、新町前、手掴、上荒川、根小屋、平南台、光洋高校前が、平成 24 年度に小名川ポンプ場が復旧したことにより、被災した 11 施設が全て復旧済。

※久之浜ポンプ場は、復興交付金により整備することとしており、復興事業計画で進捗管理を行っている。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
浜川 ポンプ場 (マンホールポンプ 制御盤)		
新町前 ポンプ場 (舗装)		
関田 ポンプ場 (水路底板)		
大原 ポンプ場 (解体・新築)		

○ 下水道管渠等

[総額 2,236 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 2,236 百万円)]

【完了】

下水道管渠のうち、中部、東部浄化センターに流入する 2 処理区は平成 24 年度に、北部、南部浄化センターに流入する 2 処理区は、平成 25 年度に復旧済。

雨水幹線のうち、大倉、蜷川、小名川幹線工区は、平成 25 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
中部浄化センターに流入する汚水管渠		
東部浄化センターに流入する汚水管渠		
大倉雨水幹線		
小名川第一排水区		

○ ごみ処理施設

[総額 268 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 268 百万円)]

【完了】

北部、南部清掃センターは、平成 23 年度に復旧済。

リサイクル施設のうち、山田粗大ごみ処理施設は、平成 23 年度に復旧済。

クリンピーの家は、平成 24 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
北部清掃センター (側壁2号 炉上部)		
南部清掃センター (建屋)		
クリンピーの家 (会議室)		
山田粗大 ごみ施設		

○ 衛生センター

[総額 399 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 399 百万円)]

【完了】

北部衛生センターは、平成 23 年度に復旧済。

中部・南部衛生センターは、平成 24 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
北部衛生センター (海水取水ポンプ室)		

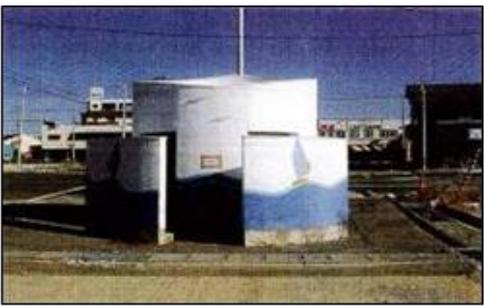
○ 公衆便所

[総額 1 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 1 百万円)]

【完了】

四倉五丁目は、平成 23 年度に復旧済。辰巳町、江名東町は、平成 23 年度に解体済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
辰巳町 (トイレ 解体)		

○ がれき処理

[総額 43,946 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 43,946 百万円)]

【完了】

災害廃棄物等の処理については平成 26 年度に 24.1 万 t の処理を実施。累計処理量は平成 27 年 3 月末現在で 93.6 万 t (H23 年度 10.3 万 t、H24 年度 31.0 万 t、H25 年度 28.2 万 t) となり、全ての処理を完了した。

仮置場については、19 箇所全てにおいて集積した廃棄物の処理が完了し、整地等現状復旧を終了した。

< 災害廃棄物等の処理状況 >

区分	発生量	H25までの処理済量		
		H26処理済量	未処理量	
災害廃棄物	再生利用	51.9万 t	51.3万 t 0.6万 t	0.0万 t
	焼却	2.0万 t	1.1万 t 0.9万 t	0.0万 t
	埋立	14.5万 t	13.0万 t 1.5万 t	0.0万 t
津波堆積物	25.2万 t		4.1万 t 21.1万 t	0.0万 t
合計	93.6万 t		93.6万 t	0.0万 t

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
新舞子ハイツ グラウンド 仮置場		
仁井田川 河口広場 仮置場		
北緑地 グラウンド 仮置場		
勿来 市民運動場 仮置場		

5 保健福祉部 (完了 11 件 / 一部遅延 0 件 : 契約事業費ベースの進捗率 100%)

○ 保育所

[総額 140 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 140 百万円)]

【完了】

住吉、平、江名、下神白の 4 保育所は、平成 24 年 6 月議会で廃止条例を議決。

窪田、滝尻、泉、川部の 4 保育所は、改修等により、平成 24 年度に復旧済。

田人保育所は、平成 25 年度に復旧済。

※豊間保育所は、豊間中学校を豊間小学校隣接地に敷地造成し整備するのに併せ、中学校校舎 1 階に整備する。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
鹿島保育所 (外壁)		
窪田保育所 (外壁)		
川部保育所 (天井)		
田人保育所		

○ 放課後児童クラブ

[総額 7 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 7 百万円)]

【完了】

永崎小放課後児童クラブ室は、平成 24 年度に復旧済。

豊間小、江名小、久之浜一小の 3 放課後児童クラブは、実施場所を移して、平成 23 年度に再開。また、久之浜一小の放課後児童クラブは、現在、震災前の場所に戻り実施中。なお、豊間小放課後児童クラブは、豊間中学校を豊間小学校隣接地に敷地造成し整備するのに併せ、中学校校舎 1 階に整備する。

○ 児童館

[総額 9 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 9 百万円)]

【完了】

被災した植田児童館は、再開のため賃借していた植田駅前の空き店舗を、条例改正により公の施設に位置付け。(平成 24 年 4 月 1 日施行)

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
植田児童館 (復旧後の写真は移設先。平成 28 年 3 月 31 日「こども元気センター」の設置に伴い、植田児童館を廃止)		

○ 老人福祉施設

[総額 13 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 13 百万円)]

【完了】

千寿荘、徳風園の 2 養護老人ホームと、4 老人福祉センター、老人憩いの家は、平成 23 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
千寿荘 (外部)		

施設等名	復旧前	復旧後
千寿荘 (軒天)		
徳風園 (舗装)		
徳風園 (外壁)		

○ その他の福祉施設

[総額 8 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 8 百万円)]

【完了】

内郷授産所、総合保健福祉センター、健康福祉プラザは、平成 23 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
健康福祉 プラザ (プール 天井)		

7 農林水産部（完了15件／一部遅延0件：契約事業費ベースの進捗率100%）

○ 宿泊施設

[総額8百万円（うち平成27年度までの契約済額8百万円）]

【完了】

いわきの里鬼ヶ城、遠野オートキャンプ場、田人おふくろの宿は、平成23年度に復旧済。

○ 農業基盤施設等

[総額511百万円（うち平成27年度までの契約済額511百万円）]

【完了】

農道は、上小川の高谷地地区が平成24年8月に復旧し、全65箇所が平成24年度までに復旧済。

ため池は、江畑町茶立場地内が平成25年4月、北神谷御代作地内が平成25年7月に復旧し、全32箇所が平成25年度までに復旧済。

農業用取水堰は、四倉町戸田地内が平成25年5月、平赤井地内が平成25年7月に復旧し、全7箇所が平成25年度までに復旧済。

橋梁は、渡辺町松小屋地内が平成25年6月に復旧し、全1箇所が平成25年度に復旧済。

水路は、錦町成沢地区が平成25年4月、小川町間門地区が平成25年7月に復旧し、全171箇所が平成25年度までに復旧済。

排水機場は、下仁井田排水機場が平成27年5月に復旧し、全4箇所が平成27年度までに復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
農道 (上小川 高谷地地区)		
ため池 (江畑町)		

施設等名	復旧前	復旧後
農業用 取水堰 (四倉町 戸田地内) 頭首工破損		
橋梁 (渡辺町)		
水路 (錦町 成沢地区) 水路隆起		
排水機場 (下仁井田)		

○ 林業基盤施設等

[総額 152 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 152 百万円)]

【完了】

上三坂・下三坂市民運動広場、ときわ台環境保全林内調整池、公有林 4 箇所は、平成 23 年度に復旧済。

林道のうち、68 路線は、平成 23 年度に復旧済。

鮫川線及び桐ヶ岡線は、平成 24 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
林道 (鮫川線)		

○ 市場

[総額 291 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 291 百万円)]

【完了】

小名浜魚市場西棟解体工事は、平成 24 年度にしゅん工済。

中央卸売市場は、敷地内の法面崩落等を平成 24 年度に復旧済。

※ 復興交付金を活用して、小名浜港 1 号ふ頭へ市場を整備したところであり、魚市場・凍結品荷捌き施設が 11 月 21 日に、冷凍冷蔵施設が 3 月 20 日にしゅん工した。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
小名浜 魚市場 正面玄関		

施設等名	復旧前	復旧後
<p>小名浜 魚市場西棟 (解体)</p>		
<p>中央卸売市場 南側の法面</p>		

8 商工観光部（完了 20 件／一部遅延 0 件：契約事業費ベースの進捗率 100%）

○ 宿泊施設

[総額 104 百万円（うち平成 27 年度までの契約済額 104 百万円）]

【完了】

勿来の関荘は、平成 23 年度に復旧済。

平ユースホステルは、平成 23 年度に解体撤去済。

新舞子ハイツは、平成 23 年度に本館の改修工事等は完了。平成 24 年度は、本館西側アスファルト道路修繕、及び本館耐震化工事設計、ヘルスプール改修工事設計の発注。平成 25 年度は、本館耐震補強工事を実施した。

※子ども元気復活交付金を活用して、新舞子ハイツヘルスプールを整備したところであり、改修工事が平成 27 年 2 月 27 日にしゅん工した。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
新舞子 ハイツ (本館西側 アスファルト道路)		
新舞子 ハイツ (レストラン裏面 出入口)		
勿来の関荘 (内装)		

○ 観光施設

[総額 23 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 23 百万円)]

【完了】

石炭・化石館ほるる、さはこの湯公衆浴場、海竜の里センター、勿来関文学歴史館は、平成 23 年度に復旧済。

二ツ箭山は、平成 24 年度に現地の安全性を確認し、入山を可能とした。さらに、平成 24 年度は、背戸峨廊、波立薬師弁天橋の詳細な現地調査を実施した。

調査結果を踏まえ、背戸峨廊については、散策路の修繕を平成 25 年度に実施し、「トッカケの滝」まで復旧済。

なお、波立薬師弁天橋は、震災による地盤沈下及び津波による欄干の破損のため立ち入りを禁止しており、現在、整備方法について検討中である。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
さはこの湯 (屋根瓦)		
石炭・化石館 ほるる		
背戸峨廊		

○ 産業関連施設

[総額 406 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 406 百万円)]

【完了】

労働福祉会館・勿来勤労青少年ホームは、平成 23 年度に復旧済。

久之浜地区仮設店舗・事務所（浜風商店街）は、平成 23 年 9 月にオープン。

四倉中核工業団地内仮設施設等は、平成 24 年 4 月に仮設施設の工事等が全て完了し、入居希望事業者 72 社（うち市内 3 社）に引き渡し済。

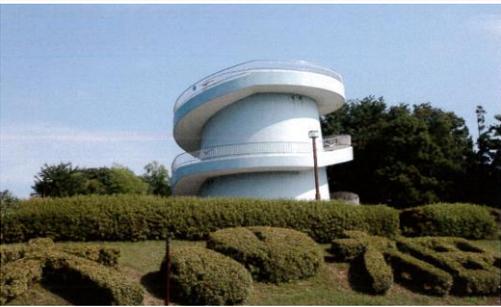
小名浜臨海工場団地緑地は、平成 24 年度に復旧済。

いわき産業創造館企画展示ホールは復旧し、平成 24 年度に供用再開済。

空き工場・空き店舗に入居する際の補助制度は、平成 25 年度までに延べ 391 件が活用。

共同職業訓練センターは、好間地区へ移転し、平成 25 年度に供用開始。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
小名浜臨海 工業団地緑地 (展望台)		
共同職業訓練 センター (復旧後は 移転先)		

○ 公衆便所

[総額 18 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 18 百万円)]

【完了】

波立駐車場公衆便所など 4 箇所は平成 23 年度に、塩屋埼灯台下公衆便所は平成 24 年度に復旧済。仁井田浦キャンプ場公衆便所など 6 箇所は平成 23 年度に、勿来海水浴場公衆便所は平成 24 年度に解体撤去済。

薄磯海岸公衆便所は、平成 25 年度に解体撤去済。

豊間海岸海水浴場公衆便所は、土地区画整理事業の進捗及び今後の需要の有無を考慮したうえで、新設の可否を判断するため、復旧箇所数から除外する。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
塩屋埼灯台 下公衆便所		
薄磯海岸 公衆便所 (解体)		

○ 公営競技施設

[総額 65 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 65 百万円)]

【完了】

いわき平競輪場 (本場)、郡山場外車券売場は、平成 23 年度に復旧済。

平場外車券売場は、平成 24 年度に解体撤去済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
平場外 車券売場		

9 土木部 (完了8件/一部遅延0件:契約事業費ベースの進捗率 100%)

○ 道路

[総額 2,921 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 2,921 百万円)]

【完了】

被害箇所 2,291 箇所のうち、平成 24 年度までに 2,239 箇所が復旧済。忠多 9 号線外 4 路線など 50 箇所は、平成 25 年度に復旧済。根小屋 1 号線など 2 箇所は、平成 26 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
平谷川瀬地内 (単独災)		
好間町愛谷 花輪地内 花輪・ 向吹ヶ線 (公共災)		
内郷内町地内 宮沢・蛭内線 (公共災)		
勿来町 白米地内 白米団地 1号線 (公共災)		

施設等名	復旧前	復旧後
萱手 19 号線 (公共災)		
根小屋 1 号線 (公共災)		
橋出馬落前線 (公共災)		

○ 橋梁

[総額 608 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 608 百万円)]

【完了】

河川内の作業が非出水期 (11 月～5 月) に限定されるなどの制約が多い中、被害箇所 24 橋のうち、平成 24 年度までに 11 橋が復旧済。渚・滝尻線 (小泉橋) など 10 橋は、平成 25 年度に復旧済。島・住吉線 (島橋) など 3 橋は平成 26 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
渚・滝尻線 (小泉橋) (公共災)		
島・住吉線 (島橋) (公共災)		
岸ノ内 ・ 橋本線 (橋本橋) (公共災)		
橋出馬落前線 (大平川 1号橋) (公共災)		

○ 河川

[総額 858 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 858 百万円)]

【完了】

浦沢川、赤沼川など 31 箇所は、平成 23 年度に復旧済。

原高野川、横手川など 9 箇所は、平成 24 年度に復旧済。

藤間川など 10 箇所は、平成 25 年度に復旧済。

大平川は、平成 26 年度に復旧済。

御堂川、横内川は、平成 27 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
藤間川		
大平川		
御堂川		
横内川		

○ 都市排水施設

[総額 911 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 911 百万円)]

【完了】

岡小名排水路など 42 箇所は、平成 23 年度に復旧済。

野木前排水路など 7 箇所は、平成 24 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
岡小名 排水路		
野木前 排水路		

○ かけ崩れ

[総額 224 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 224 百万円)]

【完了】

四倉町上仁井田(岸前地区)、好間町北好間(堂田1号地区)、鹿島町上蔵持(江名口地区)の3箇所は平成 24 年度に復旧済。

小名浜大原(原木田地区)など 8 箇所は、平成 25 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
かけ崩れ (原木田)		

○ 住宅団地被災

[総額 65 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 65 百万円)]

【完了】

忠多地区、泉もえぎ台地区は、道路災との整合を図った工事を行うべく測量・設計委託を平成 24 年度に実施。

※復旧工事は、復興交付金により対応することとしており、復興事業計画で進捗管理を行っている。

○ 市営住宅

[総額 302 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 302 百万円)]

【完了】

被害のあった市営住宅は、平成 23 年度に全て復旧済。用途廃止する市営住宅については、平成 23 年 12 月議会で条例を改正済。

豊間 B、C 団地は、平成 23 年度に解体済。

上湯長谷、根小屋、塙、赤仁田、梅ヶ丘団地は、平成 24 年度に解体済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
赤井団地		

施設等名	復旧前	復旧後
原木田前 団地		
下湯長谷 団地道路		

○ 道の駅よつくら港(情報館)

[総額 34 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 34 百万円)]

【完了】

内外装修繕は、平成 24 年度に復旧済。

地盤嵩上げは、県事業による復興交付金を活用した工事と連動させるとともに、情報館は、復興交付金を活用して、平成 25 年度内に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
道の駅 よつくら港 (情報館)		

10 都市建設部 (完了3件/一部遅延0件: 契約事業費ベースの進捗率 100%)

○ 駅前広場

[総額 41 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 41 百万円)]

【完了】

被害のあった4箇所全てが、平成 23 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
いわき駅 南北自由通路		
泉駅 自由通路		
植田駅前 広場		
湯本駅前 広場		

○ 応急修理制度

[総額 8,307 百万円 (うち平成 27 年度までの支払済額 8,307 百万円)]

【完了】

国の災害救助法に基づき「全壊・大規模半壊又は半壊した住宅」を一定の範囲内で応急修理したもの。

申請受付 : H24. 3 末終了 (受付数 18,988 件)

見積書提出期限 : H25. 9 末終了 (見積数 17,214 件)

完了報告提出期限 : H26. 3 末終了 (完了数 17,073 件)

○ 公園

[総額 252 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 252 百万円)]

【完了】

松ヶ岡公園、丹後沢公園など 44 箇所は、平成 23 年度に復旧済。

矢田川公園、北ノ作第一児童公園、新舞子浜公園は、平成 24 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
矢田川公園		
北ノ作第一児童公園		

11 教育委員会 (完了 16 件 / 一部遅延 0 件 : 契約事業費ベースの進捗率 100%)

○ 小学校校舎 (校庭)

[総額 736 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 736 百万円)]

【完了】

被害のあった 69 箇所小学校校舎 (校庭) のうち、平一小、中央台北小、小名浜一小など 66 箇所は平成 23 年度に復旧済。

桶売小は、平成 24 年度に復旧済。

植田小は、平成 25 年度に復旧済。

永崎小は、平成 26 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
永崎小 (教室)		
久之浜一小 (犬走り)		
赤井小 (昇降口 前階段)		
永崎小 (敷地)		

○ 小学校体育館

[総額 512 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 512 百万円)]

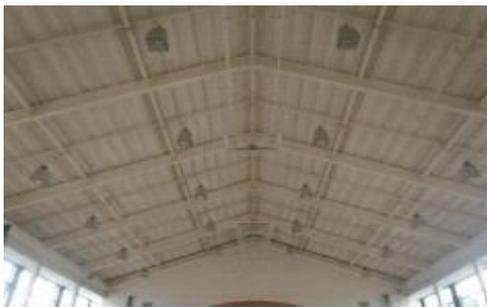
【完了】

被害のあった 37 箇所の小学校体育館のうち、好間二小、錦東小、永崎小など 35 箇所は、平成 23 年度に復旧済。

湯本二小は、平成 24 年度に復旧済。

植田小は、平成 25 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
永崎小 (体育館 入口)		
好間一小 (天井)		
植田小 (体育館)		

○ 小学校プール

[総額 15 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 15 百万円)]

【完了】

被害のあった小学校プール 19 箇所は、平成 23 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
四倉小 (プールサイド)		

○ 中学校校舎 (校庭)

[総額 300 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 300 百万円)]

【完了】

被害のあった 42 箇所のうち、平一中、江名中、勿来一中など 35 箇所については、平成 23 年度に復旧済。

小名浜一中、植田中、永井中、貝泊中、桶売中の 5 箇所は、平成 24 年度に復旧済。

※豊間中及び田人中学校は、「学校のあり方」に関する基本方針に基づき対応することから、復興事業計画で進捗管理を行っている。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
四倉中 (校舎入口)		
泉中 (校舎周り)		

○ 中学校体育館

[総額 452 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 452 百万円)]

【完了】

被害のあった 26 箇所の中学校体育館のうち、赤井中、平二中、玉川中など 22 箇所は、平成 23 年度に復旧済。

植田中は、平成 24 年度に復旧済。

泉中は、平成 26 年度に復旧済。

※ 豊間中及び田人中学校は、「学校のあり方」に関する基本方針に基づき対応することから、復興事業計画で進捗管理を行っている。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
小名浜二中 (体育館 壁面)		
植田中 (犬走り)		
泉中 (体育館)		

○ 中学校プール

[総額 15 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 15 百万円)]

【完了】

被害のあった 14 箇所の中学校プールのうち、四倉中、泉中、湯本一中など 11 箇所は、平成 23 年度に復旧済。

赤井中は、平成 24 年度に復旧済。

※豊間中及び田人中学校は、「学校のあり方」に関する基本方針に基づき対応することから、復興事業計画で進捗管理を行っている。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
四倉中 (プール サイド)		
四倉中 (ポンプ室 階段)		

○ 幼稚園

[総額 184 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 184 百万円)]

【完了】

被害のあった 15 箇所の幼稚園のうち、高坂幼稚園を除く 14 箇所は、平成 23 年度に復旧済。

高坂幼稚園は、平成 25 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
藤原幼稚園 (入口)		
高坂幼稚園		

○ 公民館

[総額 159 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 159 百万円)]

【完了】

一部損壊の 26 箇所の公民館は、平成 24 年度に復旧済。

江名公民館は、仮設公民館・市民サービスセンターとして平成 24 年 1 月に供用開始。

※被災した江名市民サービスセンターと機能を集約し、移転改築のうえ、平成 27 年 4 月 1 日から業務開始。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
江名公民館		
山田公民館		
渡辺公民館		

○ 図書館等

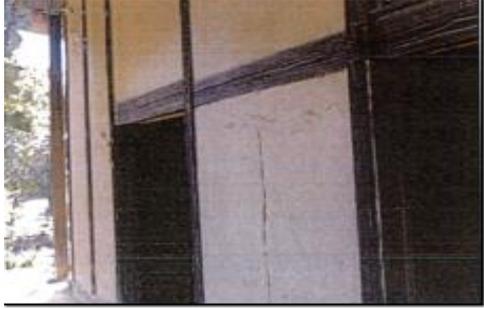
[総額 78 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 78 百万円)]

【完了】

6 図書館 (いわき総合、小名浜、勿来、常磐、内郷、四倉)、生涯学習プラザ、5 文化施設 (美術館、考古資料館、草野心平記念文学館、暮らしの伝承郷、アンモナイトセンター) は、平成 23 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
いわき総合 図書館		

施設等名	復旧前	復旧後
草野心平 記念文学館		
暮らしの 伝承郷		

○ 体育施設

[総額 376 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 376 百万円)]

【完了】

被害のあった体育館、市民運動場、野球場など 28 箇所のうち、総合体育館、四倉市民運動場、陸上競技場など 18 箇所は、平成 23 年度に復旧済。

また、勿来体育館、遠野市民運動場、平テニスコートなど 10 箇所は、平成 24 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
陸上競技場		
平野球場 (スタンド)		

施設等名	復旧前	復旧後
小名浜 市民プール		
遠野市民 運動場		
勿来体育館 (駐車場 入口)		

○ 学校給食共同調理場

[総額 1,597 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 1,597 百万円)]

【完了】

被害のあった 8 施設のうち、平南部、小名浜、常磐など 5 施設は、平成 23 年度に復旧済。

平北部、四倉の 2 施設は、平成 24 年度に復旧済。

※ 田人は平成 27 年度をもって廃止。また、勿来は復興事業計画に基づき移転改築を行い、平成 28 年度より供用開始。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
常磐学校 給食共同 調理場		
平北部学校 給食共同 調理場		

12 消防本部 (完了5件/一部遅延0件:契約事業費ベースの進捗率100%)

○ 消防施設等

[総額 196 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 196 百万円)]

【完了】

被害のあった各消防署庁舎等 (平・小名浜・勿来・常磐・内郷消防署、四倉分署、川前・江名・田人・遠野・三和分遣所) は平成 23 年度に復旧済。消防車両 4 台も平成 23 年度に復旧 (整備) 済。

消防団施設については、47 箇所のうち 36 箇所を平成 23 年度に復旧済。残りの沿岸域の全壊 11 箇所のうち平成 27 年度末までに整備の完了していない第 1 支団 (豊間、薄磯)、第 2 支団 (永崎、小名浜下神白)、第 3 支団 (岩間) については、沿岸部の震災復興土地区画整理事業との整合性を図りながら、復興事業として整備を進めている。

また、被害のあった消防団機械 30 台のうち 22 台は平成 23 年度に復旧済。残りの沿岸域の全壊 8 台についても、平成 27 年度末までに復旧済。

なお、被害のあった消防水利については、平成 24 年度に 10 箇所を復旧し、全 79 箇所を復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
江名分遣所 (通信室)		
江名分遣所 (通信室)		
消防水利 (防火水槽)		

13 水道局 (完了 10 件 / 一部遅延 0 件 : 契約事業費ベースの進捗率 100%)

○ 水道施設等

[総額 1,590 百万円 (うち平成 27 年度までの契約済額 1,590 百万円)]

【完了】

水道局庁舎は、平成 23 年度に復旧済。

上水道の導水施設 8 箇所、送水施設 14 箇所は平成 23 年度に、浄水施設 21 箇所は平成 24 年度に復旧済。

簡易水道の浄水施設 2 箇所は平成 23 年度に、配・給水管 53 箇所、導水施設 5 箇所は平成 24 年度に復旧済。

上水道の配・給水管は、造成宅地滑動崩落対策事業、道路復旧等に併せて平成 25 年度に復旧済。

配水池は、八幡小路高架タンク代替ポンプ設置を平成 25 年度内に完了。湯長谷配水池、松ヶ台配水池の撤去工事は行わず、減圧弁の設置により対応し復旧した。

新大平橋の配水管は、平成 25 年度に復旧済。

永崎地内大平川横断配水管(大平川 1 号線)は、平成 26 年度に復旧済。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
上野原 導水路		
泉浄水場内 送水管		
平浄水場内 敷地		

施設等名	復旧前	復旧後
四倉町 梅ヶ丘 上水道		
八幡小路 (高架タンク → 代替ポンプ 設置)		
永崎地内 大平川横断 配水管 (大平川 1号線)		

14 総合磐城共立病院（完了2件／一部遅延0件：契約事業費ベースの進捗率100%）

○ 総合磐城共立病院等

[総額 448 百万円（うち平成 27 年度までの契約済額 448 百万円）]

【完了】

看護学院は、平成 23 年度に復旧済。

総合磐城共立病院地盤沈下、クラック修繕等は、平成 23 年度に復旧済。耐震補強工事は、平成 25 年度に完了。

□ 主な被害及び復旧の状況

施設等名	復旧前	復旧後
総合磐城 共立病院 外来棟 1階西側 (地盤沈下)		
総合磐城 共立病院 旧泌尿器 病棟1階 (クラック)		
看護学校 体育館屋根		
総合磐城 共立病院 中央病棟 D工区2~4階 (耐震 補強工事)		

施設等名	復旧前	復旧後
総合磐城 共立病院 中央病棟 D工区1階 (耐震 補強工事)		
総合磐城 共立病院 G工区 (耐震 補強工事)		
