



集中復興期間（H23～27年度）における「市復旧計画」に基づく取組について

1 復旧計画について

復興に向けた基本方針等を示した「復興ビジョン」（H23.9月策定）に基づき、被災した公共施設や社会基盤等の復旧に係る工程表を平成23年10月に策定したものであり、この工程表により、震災からの早期復旧を図るとともに、市民の皆さまの安全・安心を最大限に確保しながら、復旧に向けた事業を推進してきました。

- 計画期間：平成23～25年度（3か年）
- 全体事業費：725億6,400万円（契約額ベース）
- 施設等区分：124区分（すべて完了）

復旧事業の総事業費については、当初計画では約614億円と見込んでいましたが、その後の市民の皆さまのニーズを踏まえた復旧手法の変更や、資材・労務単価の上昇などの変動要因により、約726億円（約112億円増）となり、事業が一部遅延しましたが、平成27年度に124区分すべて完了しました。

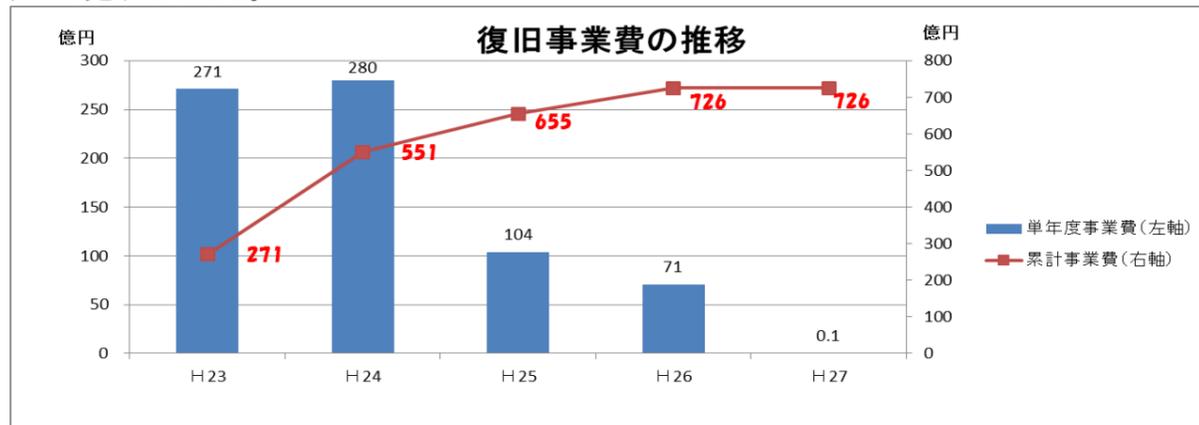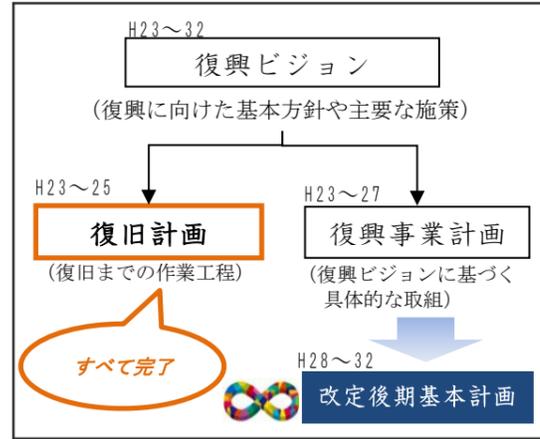

2 主な取組内容

(1) 生活・環境

(11区分/事業費484億円)

①ごみ処理施設（約3億円）

H23年度：北部、南部清掃センター、山田粗大ごみ処理施設を復旧
H24年度：リサイクルプラザクリンピーの家を復旧



②がれき処理（約439億円）

H23年度：10.3万t H24年度：31.0万t H25年度：28.2万t
H26年度：24.1万t（合計）93.6万tを処理
※仮置場については、19か所全てにおいて集積した廃棄物の処理を完了し、整地等現状復旧した。

(2) 土木

(8区分/事業費59億円)

①道路（約29億円）

H24年度までに：2,239か所復旧
H25年度：50か所復旧（忠多9号線《常磐》外4路線等）
H26年度：2か所復旧（根小屋1号線《勿来》等）
全2,291か所を復旧



②河川（約9億円）

H23年度：31か所復旧（浦沢川《平》、赤沼川《平》等）
H24年度：9か所復旧（原高野川《平》、横手川《小名浜》等）
H25年度：10か所復旧（藤間川《平》等）
H26年度：1か所復旧（大平川《小名浜》）
H27年度：2か所復旧（御堂川《勿来》、横内川《久之浜》）
全53か所を復旧

(3) 教育

(16区分/事業費44億円)

①小学校校舎・校庭（約7億円）

H23年度：66か所復旧（平一小、中央台北小、小名浜一小等）
H24年度：桶売小復旧
H25年度：植田小復旧
H26年度：永崎小復旧 全69か所を復旧

②中学校校舎・校庭（約3億円）

H23年度：35か所復旧（平一中、江名中、勿来一中等）
H24年度：5か所復旧（小名浜一中、植田中、永井中等）
全40か所を復旧
※豊間中、田人中は「学校のあり方」に関する基本方針に基づき対応。

③学校給食共同調理場（約16億円）

H23年度：5か所復旧（平南部、小名浜、常磐等）
H24年度：2か所復旧（平北部、四倉）
全7か所を復旧（※田人はH27年度をもって廃止。勿来は復興事業計画に基づき移転改築を行い、H28年度から供用開始）



(4) 農林・水産

(15区分/事業費10億円)

①農業基盤施設等（約5億円）

H24年度までに：【農道】65か所復旧
H25年度までに：【ため池】32か所復旧、
【農業用取水堰】7か所復旧、
【橋梁】1か所復旧、【水路】171か所復旧、
H27年度：【排水機場】4か所復旧

②市場（約3億円）

H24年度：小名浜魚市場西棟解体工事完了
中央卸売市場は敷地内の法面崩落等を復旧



(5) 商工・観光

(20区分/事業費6億円)

①観光施設（約2,300万円）

H23年度：石炭・化石館ほるる、さはこの湯、海竜の里センター、勿来関文学館歴史館を復旧
H24年度：二ツ箭山、背戸峨廊、波立薬師弁天橋の詳細な現地調査（二ツ箭山は安全性の確認がとれ入山可能）
H25年度：背戸峨廊の散策路復旧（トッカケの滝まで）



②産業関連施設（約5億円）

H23年度：労働福祉会館、勿来勤労青少年ホームを復旧、久之浜地区仮設店舗・事務所（浜風商店街）オープン
H24年度：四倉中核工業団地内仮設施設の工事等完了、小名浜臨海工場団地緑地、産業創造館企画展示ホールの復旧
H25年度：共同職業訓練センターが好間地区へ移転し供用開始

(6) その他

(54区分/事業費123億円)

①応急修理制度（約83億円）

全壊、大規模半壊又は半壊した住宅を応急修理（上限52万円）
実績：全壊1,175世帯 大規模半壊3,167世帯 半壊12,731世帯
合計17,073世帯

②下水道管渠等（約22億円）

H24年度：中部、東部浄化センターに流入する2処理区を復旧
H25年度：北部、南部浄化センターに流入する2処理区を復旧

